

پروژه پایانی کلاس Primavera P6

لطفاً موارد ذیل در پروژه لحاظ گردد :

- ۱- تهیه برنامه زمانبندی به همراه WBS و گانت چارت
- ۲- تعریف کلیه اطلاعات درج شده در workshop
- ۳- محاسبه Weight Factor هر فعالیت (WF ترکیبی محاسبه شود)
- ۴- تهیه نمودار S پیشرفت برنامه ای پروژه
- ۵- واقعی نمودن برنامه و تهیه نمودار S پیشرفت واقعی ای پروژه برای ۳ ماه بطور دلخواه و محاسبه تاخیرات از برنامه

Baseline

مشخصات کلی پروژه


ساختار EPS پروژه : MIS (سیستم اطلاعات مدیریت) کد پروژه : ST

نام پروژه : مکانیزاسیون سیستم انبار مدیر پروژه : آقای یوسفی


تاریخ شروع پروژه : ۱۴۰۱-۰۱-۲۲ تقویم پروژه : شش روز کاری - جمعه ها تعطیل -

پنجشنبه ها نیم روز کاری

ساختار شکست کار (WBS)

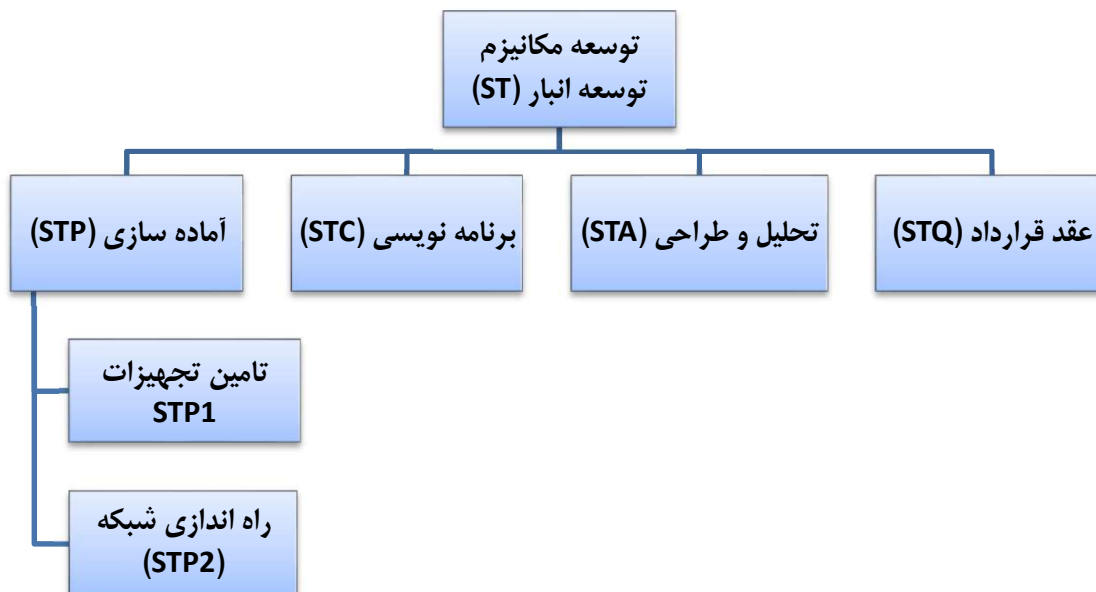

ساختار EPS و OBS

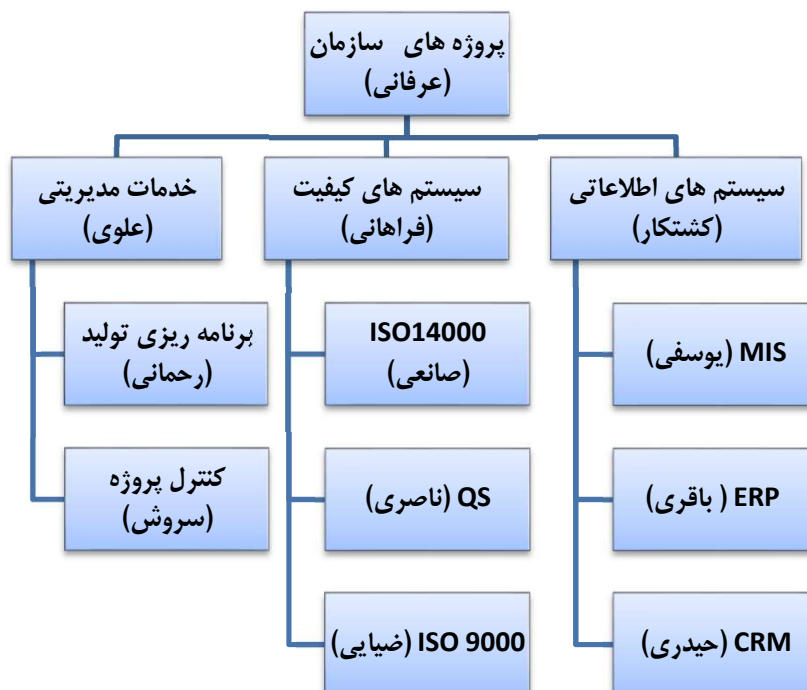

کد فعالیت	WBS	شرح فعالیت	Pred.	Dur.	تخصیص منابع			اسناد مرتبط	دپارتمان
					منبع	مصرف (h/d)	شماره حساب		
A90	STQ	شروع	-	0	-	-	-	-	-
A100	STQ	برآورد اولیه هزینه پروژه	A90	3	A3 A4	5 5	C111 C111	-	سیستم ها
A110	STQ	تهیه شرح خدمات و مراحل انجام کار	A100	10	A4 A5	8 8	C111 C111	شرح خدمات	سیستم ها
A120	STQ	تهیه پیش قرارداد	A110	7	A3 A4	6 6	C111 C111	پیش قرارداد	سیستم ها
A130	STQ	عقد قرارداد	A120	2	A1 A2	2 1	C121 C121	قرارداد	مدیرعامل
A140	STA	شناخت وضعیت موجود	A130	30	A4 A5	7 7	C121 C121	گزارش وضعیت موجود	انبار پیمانکار
A150	STA	تحلیل نیازها	A140	10	A4 A5	5 5	C121 C121	گزارش تحلیل نیازها	سیستم ها
A160	STA	ارائه سیستم پیشنهادی	A150	20	A4 A5	10 10	C121 C121	گزارش سیستم پیشنهادی	سیستم ها
A170	STC	نصب نرم افزارهای پایه	-	1	A7	3	C121		نرم افزار
A180	STC	کد کردن برنامه	A160 A170	60	A7 A8	8 8	C121 C121		نرم افزار
A190	STC	تست اولیه برنامه	A180	5	A5	5	C121		سیستم ها
A200	STC	رفع اشکالات برنامه	A190	7	A7 A8	6 6	C121 C121		نرم افزار
A210	STC	نصب دائم برنامه	A200 A300	1	A8	4	C121 C121		انبار پیمانکار
A220	STC	آموزش سیستم جدید	A210	7	A5	3	C121		انبار پیمانکار
A230	STP1	برآورد سخت افزارهای مورد نیاز سیستم	A180	2	A8	2	C121		سخت افزار
A240	STP1	تامین تجهیزات	A230	3	A10	4	C121		مناقصات و خرید
A250	STP1	نصب و راه اندازی تجهیزات در محیط انبار	A240	1	A11	10	C121		انبار پیمانکار
A260	STP2	تهیه نقشه اولیه شبکه	-	3	A6	5	C121	نقشه شبکه انبار	انبار پیمانکار
A270	STP2	برآورد تجهیزات مورد نیاز شبکه	A260	1	A6	2	C121		سخت افزار
A280	STP2	تامین تجهیزات مورد نیاز راه اندازی شبکه	A270	2	A9 A10	2 2	C121		مناقصات و خرید
A290	STP2	نصب شبکه محیط	A250 A280	4	B11 B12 A6 A8	5m 10m 3 3	C122 C122 C121 C121		انبار پیمانکار
A300	STP2	تست شبکه و رفع اشکال شبکه	A290	1	A6	5	C121		انبار پیمانکار
A310	STP2	پایان	A300	0	-	-	-		

منابع سازمان (Resources)		نقش ها (Roles)			
گروه منابع : A منابع انسانی					
کد منبع	نام منبع	نقش ها (Roles)	حداکثر زمان در دسترس (h/d)	قیمت واحد (\$/h)	
A1	عرفانی	1-1	10	80	
A2	شریعت	2-1	12	40	
A3	تاجیکفر	3-1	12	35	
A4	عیسی زاده	5-1	10	25	
A5	باقری	4-2	12	25	
A6	میلانی	3-2	8	25	
A7	شیخی	2-2	10	25	
A8	نجفی	2-1	10	25	
A9	حق پرست	1-3	8	25	
A10	ظاهری	4-1	8	15	
A11	دلیری	2-3	10	15	
گروه منابع	زیر گروه منابع	کد منبع	نام منبع	حداکثر در دسترس	قیمت واحد
B تجهیزات	B1 : مصرفی	B11	کابل شبکه	5000	300
		B12	داکت	1000	200
	B2 : غیر مصرفی	B21	رایانه	۵۰ ساعت در روز	500
		B22	تستر شبکه	۱۰ ساعت در روز	150

نقش ها (Roles)	
۱- مدیریتی	
۱-۱- مدیریت عامل	
۱-۲- مدیریت کل پروژه ها	
۱-۳- مدیریت مالی و اداری	
۱-۴- مدیریت بازرگانی	
۱-۵- مدیریت رایانه	
۲- کارشناسی	
۱-۲- کارشناس ISO۹۰۰۰	
۲-۲- کارشناس ISO۱۴۰۰۰	
۳-۲- کارشناس QS	
۴-۲- کارشناس کنترل پروژه	
۳- کارمندی	
۱-۳- کارمند خرید	
۲-۳- کارمند سفارشات	

شماره حساب هزینه ها (Cost Account)

